

Proyecto de Teletón fija su término para junio de este año

INFRAESTRUCTURA. Según detallaron del MOP, se espera que a fines de este 2026, el instituto ya esté operativo y disponible para los usuarios.

Redacción
cronica@cronicachillan.cl

Con un 95% de avance e iniciando las obras de la décima etapa final, la construcción del Instituto de Rehabilitación Infantil Teletón Nuble avanza hacia su entrega definitiva, proyectada para junio del presente año, según el Ministerio de Obras Públicas. La obra, emplazada en Avenida Argentina en Chillán, representa un hito en materia de inclusión y acceso a la salud para la región.

La proyección fue realizada por las autoridades en la zona, tras una visita inspectiva a las obras. En ese contexto, desde el MOP informaron que, tras constatar en terreno el progreso de esta emblemática iniciativa, el proyecto considera 10 etapas constructivas, con término legal vigente al 21 de junio de 2026.

95%
de avance
registra el Instituto Teletón de Nuble.

139
trabajadores
activos están presentes en las labores.



“Se espera que a fines de 2026 ya esté operativo con todos los niños y niñas y sus familias”.

Freddy Jelves
Seremi de Obras Públicas



“Creemos que cumplen todos los requisitos para entregar un muy buen servicio a la comunidad”.

Rodrigo García
Delegado presidencial


Vale mencionar que la obra es encabezada por la Dirección de Arquitectura del MOP en Nuble, cuyo financiamiento, proveniente del Gobierno Regional, alcanza los \$12 mil millones de pesos. El seremi del MOP, Freddy Jelves, sostuvo sobre el avance que “está llegando a un 95% de avance, ‘ad portas’ de iniciarse la última etapa, la etapa diez, para así poder hacer entrega de este importante edificio para toda la región de Nuble en junio de este año. Se espera que a fines de 2026 ya esté operativo con todos los niños y niñas y sus familias que necesitan atenderse en las 21 comunas de nuestra re-

gión en este tan necesario Instituto Teletón en Chillán”.

DETALLES DE LA OBRA

El proyecto contempla la construcción de 3.969 m² en un terreno de 5.104 m², incluyendo un edificio asistencial de dos plantas (subterráneo y primer piso), piscina terapéutica, dos gimnasios de rehabilitación, multicancha techada, patio central terapéutico y accesos diferenciados para público general y ambulancias.

El edificio asistencial concentra boxes de atención médica y terapias especializadas, además de áreas de apoyo clínico y servicios para el

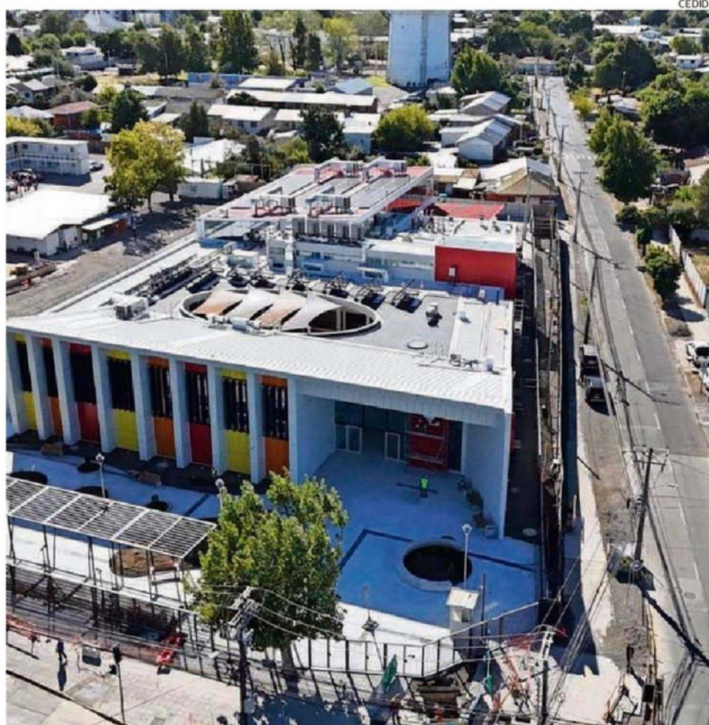

EN TOTAL, SERÁN 408 HOMBRES Y 426, ADEMÁS DE 800 NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES, LOS BENEFICIADOS.



A FINES DEL PRESENTE AÑO, LA INFRAESTRUCTURA ESTARÁ OPERATIVA PARA LOS USUARIOS.

personal. La funcionalidad del recinto se organiza en torno a un patio central, con tres accesos peatonales diferenciados según su uso, y un acceso vehicular por calle Cristóbal Colón que permite el ingreso de ambulancias hacia el subterráneo. Los beneficiarios directos corresponden a 408 hombres y 426 mujeres, más de 800 niños, niñas y jóvenes, además de sus familias.

Sobre el impacto territorial previsto a raíz del Instituto Teletón, el delegado presidencial en Nuble, destacó el

beneficio que recibirán los usuarios de la institución. “Hemos hecho un recorrido por las instalaciones de Teletón que se están construyendo, unas instalaciones que van a dar un servicio muy importante para los niños, niñas y adolescentes de la región de Nuble. Anteriormente tenían que viajar a otras regiones, lo que significaba un trayecto largo y dificultoso, y ahora van a poder acceder a estas nuevas instalaciones que recogen toda la experiencia que Teletón ha construido durante años. Creemos que cum-

plen todos los requisitos para entregar un muy buen servicio a la comunidad”.

La autoridad también subrayó que la primera piedra fue instalada en noviembre de 2024 y que, en un plazo cercano a dos años, el recinto estará disponible para la atención de público. Actualmente, la obra cuenta con 139 trabajadores activos, de los cuales un 38% corresponde a mano de obra regional, y ha generado una empleabilidad total estimada de 1.212 puestos durante sus 600 días de ejecución.
