

Fecha: 20-07-2025
 Medio: Maule Hoy
 Supl. : Maule Hoy
 Tipo: Noticia general

Pág. : 6
 Cm2: 418,2

Tiraje:
 Lectoría:
 Favorabilidad: ☐ Sin Datos
☐ No Definida

Título: Servicio de Salud Maule informa que obras del Hospital de Linares llegaron al 30.43% y finalizó término de actividades con Empresa Astaldi

Servicio de Salud Maule informa que obras del Hospital de Linares llegaron al 30.43% y finalizó término de actividades con Empresa Astaldi

En el marco de la construcción del Hospital de Linares, el Servicio de Salud de Salud Maule, informa que con fecha 1 de julio de 2025, la empresa Astaldi ha notificado el término de sus actividades principales, con un porcentaje de cumplimiento y avance físico del contrato original correspondiente al


30.43%.

Es importante señalar, que este plazo obedece a un compromiso adquirido en septiembre del año 2024, donde se estableció la ejecución de obras acotada con partidas definidas a un plazo de nueve meses y entre otros aspectos, el término de común acuerdo del contrato una vez

concluido el plazo establecido.

Situación actual

El Servicio de Salud Maule asumió el control del sitio de las obras a partir del 1 de julio 2025, paralelo a esto, envió información a la Contraloría General de la República, con el fin de generar la toma de razón del término

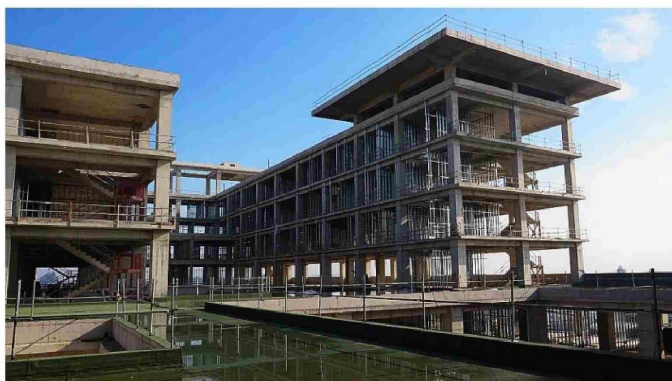

del contrato de Diseño y Obras Civiles. La toma de razón del término del contrato por parte de Contraloría es condicionante para iniciar la reconstrucción de las obras pendientes.

Reconstrucción de

obras

El proceso siguiente contempla la dictación de una resolución exenta que autorice acudir al trato directo como mecanismo de compra. Con el documento completamente tramita-

do, se puede acceder a la suscripción del contrato definitivo y retomar la ejecución de las obras pendientes y así, dar término a la construcción del nuevo Hospital de Linares.
