

VISITA INSPECTIVA

24% de avance presentan obras de nuevo Cesfam O'Higgins de Concepción

Las faenas registran un 8% más de lo esperado a la fecha. El edificio está destinado a satisfacer la creciente demanda en el sector centro de la ciudad, ya que el recinto actual en calle Salas fue superado en su capacidad.

Diario Concepción
 contacto@diarioconcepcion.cl

Un 23,5% de avance - 8% más de lo programado - presentan las obras del nuevo edificio para el Cesfam O'Higgins, destinado a satisfacer la creciente demanda en el sector centro de Concepción, ya que el recinto actual en calle Salas fue superado en su capacidad.

Así lo constató en una visita inspectiva el alcalde, Héctor Muñoz Uribe, junto al director subrogante del Servicio de Salud Concepción, Marcelo Morales Hidalgo, la directora de salud municipal, Rosario Bustos Lira, y, por parte de la comunidad, la presidenta del Consejo de Desarrollo del centro de salud, María Elena Vivanco García.

El proyecto involucra una inversión de \$10.043.987.741 con recursos aportados por el Ministerio de Salud para una población superior a las 30.000 personas.

El jefe comunal destacó que "a la fecha deberíamos llevar un 15% y tenemos un 8% más así es que es-

tamos muy contentos porque eso significa que tenemos un margen para poder avanzar y completar antes de la fecha programada de los 570 días porque los vecinos lo necesitan".

En tanto el director (s) del servicio de Salud señaló que este importante avance se logró "por la colaboración del municipio en todo lo que se ha requerido por los profesionales que están trabajando en esta obra".

Para la representante de los usuarios esta visita les entregó una buena noticia porque "el gran temor de la comunidad era que la obra se retrasara, se ampliara el plazo de espera, pero ha sido una muy grato comprobar en terreno".

Cabe recordar que, tras tres llamados de licitación por parte del Servicio de Salud Concepción desiertos sin oferentes y tras el visto bueno de la Contraloría General de República, se optó por la contratación vía trato directo de la empresa Constructora y Maqui-

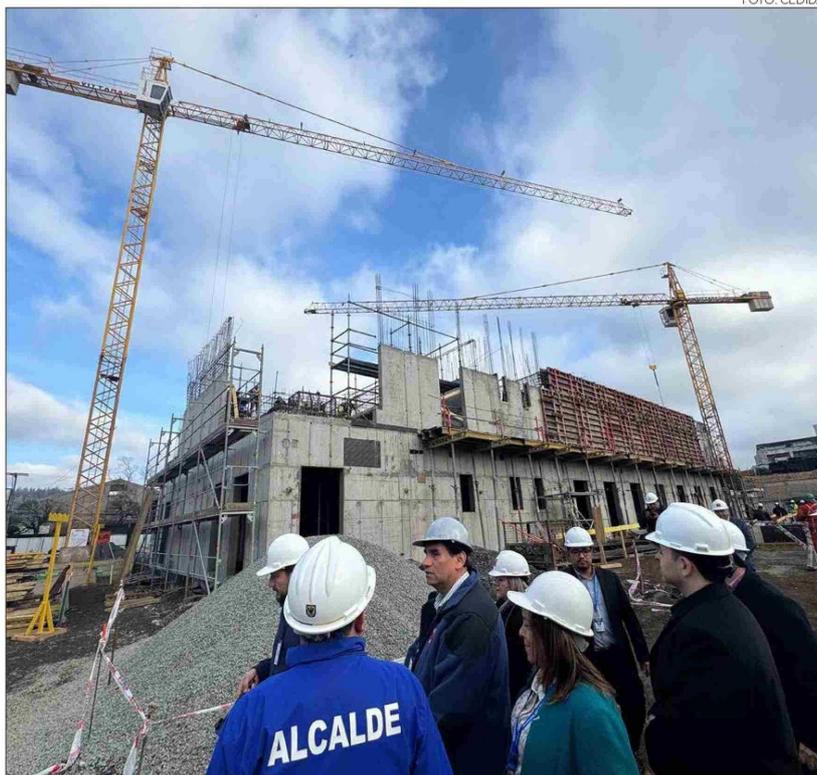


FOTO: CEDIDA

naria Pulmahue SpA

La construcción se levanta en calle Salas con Las Heras, tiene un plazo de 570 días, de los cuales ya se han cumplido 186, con una fecha de término fijada para el 7 de

agosto de 2026.

Corresponde a un edificio de tres pisos con una superficie de 2.786 m2 y 244,44 m2 de cubiertas o patios techados para lograr una fachada continua e incluye 41

salas y box de atención, equipos y equipamiento, además de un vehículo de transporte de personas.

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
 contacto@diarioconcepcion.cl
